ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.1

Разработка плана внедрения программного обеспечения

Выполнил: Лукашин Елисей Андреевич
Группа: ИСП-211
Проверил: _____

Объект внедрения: склад готовой продукции ООО «СтройГарант». Внедряемая система — «Программа складского учёта».

1. Цели внедрения

1. вести количественный учёт товара на складе в реальном времени
2. исключить пересорт и недостачи при приёмке и отгрузке
3. автоматически формировать документы приёмки, отгрузки и инвентаризации

2. Исходная ситуация

Приход и расход фиксируются в тетради и Excel, остатки на разных листах расходятся, инвентаризация занимает два дня, а расхождения находят уже после отгрузки клиенту.

Пользователи системы: кладовщик, менеджер по закупкам, бухгалтер, руководитель склада.

3. План внедрения по этапам

№	Этап	Содержание работ	Результат	Срок	Ответственный
1	Анализ	Обход склада, описание номенклатуры, анализ текущих Excel-файлов и причин расхождений	Требования и ТЗ	4 дн.	Руководитель проекта
2	Подготовка	Установка сервера и PostgreSQL, печать штрихкодов для ячеек, подготовка сканеров	Готовая среда	3 дн.	Системный администратор
3	Настройка	Загрузка 1 200 позиций номенклатуры, разметка 48 ячеек, настройка прав кладовщика и бухгалтера	Настроенная система	6 дн.	Разработчик
4	Тестирование	Пробная инвентаризация одной зоны, проверка расхождения остатков, сверка с бухгалтерией	Акт сверки	3 дн.	Кладовщик, бухгалтер
5	Обучение	Обучение 6 сотрудников склада работе со сканером и ПК, инструкция по действиям при расхождении	Обученные пользователи	2 дн.	Аналитик
6	Запуск	Параллельный учёт в течение двух недель, затем полный переход	Система в работе	2 дн.	Руководитель проекта
	Итого			20 дн.	

4. Календарный план

Последовательность этапов и их длительность показаны на диаграмме. Этапы частично перекрываются: обучение начинается до полного запуска, чтобы сократить общий срок.

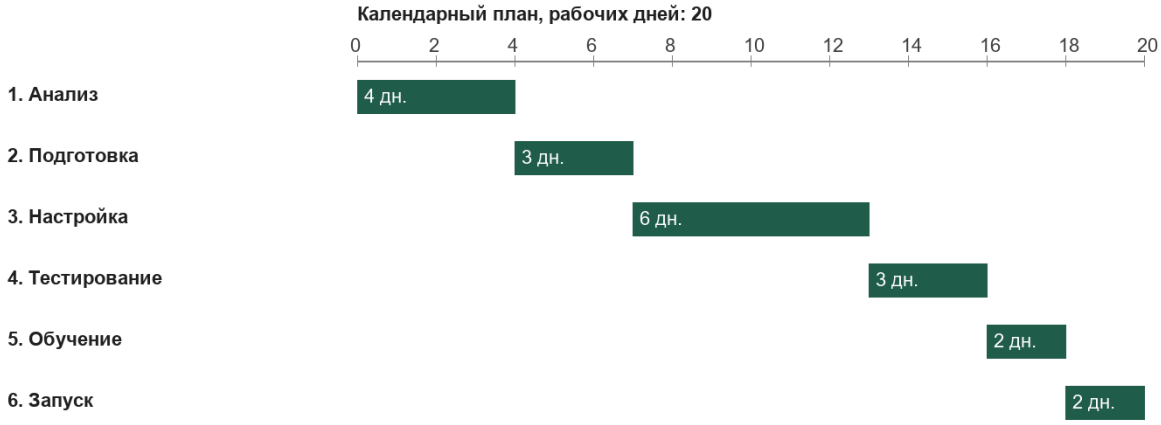


Рисунок 1. Календарный план внедрения — 20 рабочих дней

5. Ресурсы и ответственные

Роль	Задачи	Занятость
Руководитель проекта	планирование, приёмка этапов, коммуникация с руководством	30 %
Системный администратор	сервер, СУБД, резервное копирование, доступы	25 %
Разработчик	настройка системы, доработки, импорт данных	60 %
Тестировщик	проверка сценариев, регрессия, приёмка	20 %
Аналитик	обучение пользователей, инструкции, поддержка	30 %

6. Риски и меры реагирования

Риск	Вероятность	Меры
Ошибки при вводе номенклатуры	Высокая	Импорт из справочника, проверка на контрольной инвентаризации, штрихкоды
Простой склада в дни запуска	Средняя	Параллельный учёт, запуск в конце месяца, дежурство разработчика
Несоответствие данных бухгалтерии	Средняя	Сверка остатков до запуска, единый справочник номенклатуры

7. Критерии успешного внедрения

- все пользователи работают в системе без бумажного дублирования;
- время на подготовку отчётности сократилось не менее чем вдвое;
- резервное копирование выполняется ежедневно, восстановление проверено;
- за первый месяц эксплуатации не потеряно ни одной записи.

8. Вывод

Разработан план внедрения системы «Программа складского учёта» для склад готовой продукции ООО «СтройГарант». Определены цели, этапы, сроки, ответственные и ресурсы, выявлены основные риски и меры реагирования. План рассчитан на 20 рабочих дней и может быть использован как основа календарного графика проекта.
